

IHD/Asbl

Initiatives Humanitaires pour les Démunis



**Nous pouvons aussi
vivre dignement !**

Projet de Relance agricole dans la Cité de KIROCHE

RAPPORT NARRATIF FINAL

Période : Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

Adresse : 02, Av. Dikuta, Ville de Goma,
Commune de Karisimbi.

Courriel : info@ihdemunis.org

Téléphone : +243850665375

INFORMATIONS GENERALES

1. Sigle de l'organisation : **IHD**
2. Titre du Projet : Relance Agricole dans la cité de Kiroche en Territoire de Masisi
3. Montant du financement : 137 018\$
4. Nombre de bénéficiaires prévus : 1 222
5. Nombre des bénéficiaires atteints : 1 307
6. Période du démarrage prévue : 1^{er} Mars 2017
7. Période effective du démarrage : 1^{er} Avril 2017
8. Période exacte couverte par le rapport : du 1^{er} Avril 2017 au 31 Mars 2018.

N°	REALISATIONS	RESULTATS ATTENDUS	RESULTATS ATTEINTS	%	Ecart	%	COMMENTAIRES/ OBSERVATIONS
I. ACTIVITES DU PROJET DANS LA CONCESSION D'IHD A KIROCHE							
1.1	Formation :						
1.1.1	Former le personnel technique en techniques culturales du riz, de maïs et de manioc.	1 Ingénieur Agronome est recyclé.	1 Ingénieur Agronome a été recyclé	100%	0	0	RAS
		7 moniteurs Agricoles sont formés.	7 moniteurs Agricoles ont été formés.	100%	0	0	
1.1.2	Former les paysans membres des organisations de Base (OB) en techniques culturales du riz, de maïs et de manioc.	50 membres des organisations paysannes sont formés.	47 membres des organisations paysannes ont été formés.	94%	3	6%	3 personnes dont 1 de OADR, 1 de MUMEA BORA et 1 de BUGUMA ne se sont pas présentées pour avoir reçu les invitations en retard.



Travaux en carrefour lors de la formation des membres à Kiroche.

1.2.	Réhabilitation du canal d'irrigation :	<ul style="list-style-type: none"> -Un canal d'irrigation de 1000 m est dessablé ; -1 lieu de distribution d'eau d'irrigation est reconstruit en béton ; -1 traversé aérien est reconstruit en béton. 	<ul style="list-style-type: none"> -1 canal de 1000 m a été dessablé ; -1 lieu de distribution a été reconstruit en béton ; -1 traversé aérien a été reconstruit en béton. 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	0	0	RAS
------	---	--	---	-------------------------------------	---	---	-----



Ces 4 photos illustrent l'évolution des travaux de réhabilitation du canal d'irrigation au Centre d'Encadrement des Paysans de Kiroche (CEPK) effectué par IHD.

1.3.	Mécanisation de la culture du riz à Shasha.	Labour : 10 hectares de riz sont labourés et hersés Semence : 800Kgs sont achetés Sarclage : 10 H de riz sarclés	10 hectares du riz ont été labourés et hersés 800Kgs de semence du riz ont été achetés. 10h de riz ont été sarclés	100%	0	0	
------	--	--	--	------	---	---	--

		Production : 30 tonnes de riz produits	25 tonnes de riz ont été produits.	83,3%	5	16,7%	
--	--	--	------------------------------------	-------	---	-------	--




1



2



3

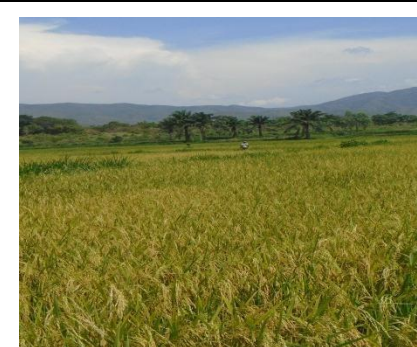

4



5



6

Photo n° 1 : Labour au motoculteur

Photo n° 2 : Les Moniteurs Agricoles sillonnent le champ de riz.

Photo n° 3 : Les femmes transplantent le riz de la pépinière au champ.

Photo n° 4 : Le Champ prêt à être récolté.

Photo n° 5 : Le Paddy récolté.

Photo n° 6 : Le paddy récolté emballé dans les sacs.


1.4	Mécanisation de la culture de maïs :						
	- Labour	-10 hectares de maïs labourés et hersés	-10 hectares de maïs ont été labourés et hersés.	100%	0	0	Il y a eu perturbation climatique à la fin de la saison.
	- Semence	-300 Kgs de semences achetés	-300 Kgs de semences ont été achetés.	100%	0	0	
	- Sarclage	-10 h de maïs sont sarclés.	-10 h de maïs ont été sarclés	100%	0	0	
- Production	-20 tonnes de maïs sont produits	-16 tonnes de maïs ont été produits	80%	4	20%		



Le Tracteur IHD labourant le champ.



Le champ de maïs à 1 mois.

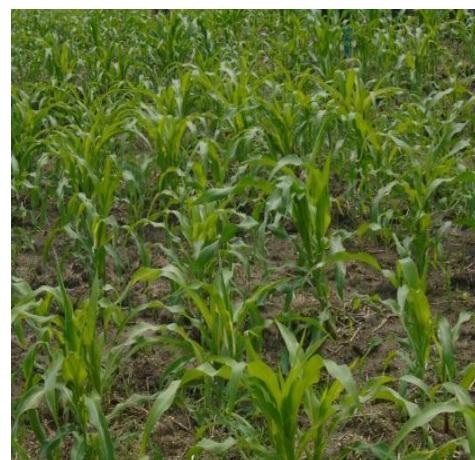

Le champ de maïs à 2 mois.



Le champ de maïs à 3 mois.



Le maïs dans le dépôt



Les maïs en train d'être égrainés.



Les journaliers égraineurs.



Pesage et emballage de maïs.

1.5	Elevage des porcs :						
	- Porcheries	-2 porcheries sont construites	-2porcheries ont été construites	100%	0	0%	
	- Animaux	- 34 des porcs sont achetés dont 17 à Kiroche et 17 à Shasha	- 34 des porcs ont été achetés dont 17 à Kiroche et 17 à Shasha	100%	0	0%	RAS
	- Produits vétérinaires	-1 lot des produits vétérinaire est acheté	-1 lot des produits vétérinaires a été acheté	100%	0	0%	



1



2



3



4

Photo n° 1, 2, 3 : Début de travaux de la construction de la porcherie de Shasha et de Kiroche. Photo n° 4, 5, 6, 7, 8 : Peuplement des porcheries de Shasha et de Kiroche.



5



6



7



8

1.6	Personnel du projet : - Personnel technique	-1 Ingénieur Agronome et 7 Moniteurs Agricoles sont recrutés	-1 Ingénieur Agronome et 7 Moniteurs Agricoles ont été recrutés.	100%	0	0%	RAS
	- Personnel administratif	-1 Coordinateur, 1 Assistant au projet et 1 financier sont affectés pour le suivi des activités du projet.	-1 Coordinateur, 1 Assistant au projet et 1 financier ont été affectés pour le suivi des activités du projet.	100%	0	0%	

II. ACTIVITES DU PROJET AVEC LES ORGANISATIONS A LA BASE (OB) ET PAYSANS MEMBRES BENEFICIAIRES							
2.1.	Organisations appuyées	1. OADR (Kiroche) 2. MUMEA BORA (Kiroche) 3. UCAPA (Bweremana) 4. BUGUMA (Bweremana) 5. CINAD (Shasha) 6. CMGL (Shashai) 7. CORESA (Kiroche) 8. CTB (Shasha) 9. APADARU (Bweremana) 10. UNION DES CULTIVATEURS DE Shasha sont appuyées.	1. OADR 2. MUMEA BORA 3. UCAPA 4. BUGUMA 5. CINAD 6. CMGL 7. CORESA 8. CTB 9. APADARU 10. UNION DES CULTIVATEURS DE SHASHA ont été appuyées.				
2.2.	Appui à la culture du riz :						
	- Labour	22 hectares de riz sont labourés et hersés	-22 hectares de riz ont été labourés et hersés.	100%	0	0	
	- Semence	1.760 Kg de semences achetés	-1760 kgs de semences ont été achetés.	100%	0	0	RAS

--	--	--	--	--	--	--	--

- Sarclage	-22 h de riz sarclés.	-22 h de riz ont été sarclés	100%	0	0	
- Production	-88 tonnes de riz sont produits	-77 tonnes de riz ont été produits	87,5%	11	12,5%	Les bénéficiaires de Bweremana n'ont pas sarclé leurs champs à temps.



Ces 2 photos montrent la remise des outils aratoires aux responsables des organisations à la base.

	Organisations de base appuyées A la culture du maïs :						
	- Labour	-11 hectares de maïs sont labourés et hersés	-11 hectares de maïs ont été labourés et hersés.	100%	0	0	
	- Semence	-330 Kgs de semences sont achetés	-330 Kgs de semences ont été achetés.	100%	0	0	
	- Sarclage	-11 h de maïs sont sarclés.	-11 h de maïs ont été sarclés	100%	0	0	

	- Production	-22 tonnes de maïs sont produits	-15 tonnes kgs de maïs ont été produits	68,1%	7	31,8%	Les bénéficiaires de Bweremana n'ont pas sarclé leurs champs à temps.
--	--------------	----------------------------------	---	-------	---	-------	---

2.3	Appui à l'élevage du porc						
	-Distribution des géniteurs	55 porcs sont achetés et sont distribués aux membres des OB dont: - 20 à Kiroche, - 15 à Bweremana, - 20 à Shasha	- 55 porcs ont été achetés et distribués aux membres des OB dont 18 à Kiroche, 15 à Bweremana, 20 à Shasha	96,36%	2	3,64%	Le fournisseur d'OADR à Kiroche n'a pas encore fourni 2 porcs.
	- Sois des animaux	-1 lot des produits vétérinaires est acheté	-1 lot des produits vétérinaires a été acheté	100%	0	0	RAS
3.	Suivi des activités du projet :						
	-Coordination	-6 missions de suivi sont réalisées par l'équipe exécutive du projet.	-6 missions de suivi ont été réalisées par l'équipe exécutive du projet.	100%	0		RAS
	-Conseil d'Administration	-1 mission est réalisée par les membres du Conseil d'Administration.	-1 mission a été réalisée par les membres du Conseil d'Administration.	100%	0		



Sur cette photo, Mme Charlotte du Ministère du Plan échange avec les Travailleurs journaliers lors de sa visite.



Mme Charlotte visite le point de distribution d'eau du canal d'irrigation



Dans le champ de maïs du projet, Mme Charlotte est accompagnée de l'lr Superviseur et quelques leaders



1



2



3

Photo 1, 2, et 3 : Le personnel clé au projet et les leaders des villages en visite de porcherie de Shasha et de Kiroche.

OBSERVATIONS ET DIFFICULTES LORS DE LA REALISATION DU PROJET

Le projet de relance agricole dans la plaine de la Ruzizi s'est butté à 2 grands types des difficultés dont :

1. Difficultés liées aux indicateurs retenus :

Les indicateurs retenus exigeaient de gros moyens financiers qui n'étaient pas disponibles. C'est le cas de :

- Pour 600 hectares de riz, il faut :
 - Labour 600 X 25 l X 1,5\$ = 22 500\$
 - Transport fumier 600 X 55\$ = 33 000\$
 - Déraciner et transporter des jeunes plants 14 160 H/J X 3.3\$ = 4 672\$
 - Repiquage 18 960 H/J X 3.3\$ = 62 568\$
 - 1^{er} et 2^{ème} sarclage 43 680 H/J X 3.3\$ = 144 144\$
 - Gardiennage 22 800 H/J X 3.3\$ = 75 240\$
 - Emballage 24 000 sacs de 100 kgs X 0.6\$ = 14 400\$

356 524\$

- Pour 400 hectares de maïs :
 - Labour 400 X 25 l X 1,5\$ = 15 000\$
 - 1^{er} et 2^{ème} sarclage 43 680 H/J X 3.3\$ = 144 144\$
 - Gardiennage 22 800 H/J X 3.3\$ = 75 240\$
 - Emballage 24 000 sacs de 100 kgs X 0.6\$ = 14 400\$

248 784\$

- Pour produire 790 000 œufs en 18 mois, il faut :

-22 000 poules pendant 360 jours dans 11 poulaillers de 200 poules.

Soit 2200 poules de 4 mois X 4\$ = 8 800\$

Construire poulaillers 11 X 500\$ = 5500\$

Provende 0.65gr X 2200 poules X 360 jours X 0.2\$ = 102 960\$

Propreté 2 pers X 3.3\$ X 360 jours = 2 376\$

119 636\$

Total : 356 524 \$ + 248 784 \$ + 119 636 \$ = 724 944 \$

Conclusion :

1. En ne prenant en compte que ces 3 exemples, il ressort que le montant de 137 018\$ était très insuffisant pour réaliser les indicateurs de départ.
2. Mais aussi, les indicateurs que nous nous sommes fixés lors de notre atelier de redéfinition des résultats n'ont pas été atteints. C'est pour cette raison que nous demandons un avenant de l'ordre de 100 000\$ à 150 000\$ pour y arriver.

Fait à Goma, le 11 mai 2018

Pour IHD
